

1 2 3 4		SUUO - Sustav upravljanja ugostiteljskim objektom				
3 4		ooo oudiav apravijanja agoditoljokim objektom	189 days	21/03/25 08:00	10/12/25 17:00	
4		Inicijalizacija projekta	4 days	21/03/25 08:00	26/03/25 17:00	
		Odabir voditelja	1 day	21/03/25 08:00	21/03/25 17:00	
_		Formiranje teama	1 day	24/03/25 08:00	24/03/25 17:00	3
5		Odreivanje dosega projekta	2 days	25/03/25 08:00	26/03/25 17:00	4
6		Ocjena izvedivosti projekta	2 days	25/03/25 08:00	26/03/25 17:00	4
7	Ö	Odreivanje zahtjeva	22 days	29/03/25 08:00	29/04/25 17:00	2
8	Ö	Intervju s naruiteljem sustava	5 days	29/03/25 08:00	04/04/25 17:00	
9		Intervju s dobavljaem namirnica	2 days	07/04/25 08:00	08/04/25 17:00	8
10	Ö	Pisanje zapisnika	5 days	09/04/25 08:00	15/04/25 17:00	8;9
11		Definicija korisnikih zahtjeva	7 days	16/04/25 08:00	24/04/25 17:00	10
12		Analiza izvedivosti zahtjeva	2 days	25/04/25 08:00	28/04/25 17:00	11
13		Usuglašavanje o zahtjevima	1 day	29/04/25 08:00	29/04/25 17:00	11;12
14	Ö	Dizajn sustava	38 days	02/05/25 08:00	24/06/25 17:00	7
15		Dogovor o korištenju tehnologija	2 days	02/05/25 08:00	05/05/25 17:00	
16		Odreivanje funkcionalnosti	3 days	06/05/25 08:00	08/05/25 17:00	15
17		Dizajn korisnikih suelja	13 days	09/05/25 08:00	27/05/25 17:00	15;16
18		Dizajn web suelje za rezervacije	3 days	09/05/25 08:00	13/05/25 17:00	
19	Ö	Dizajn konobarovih suelja za unos narudžbi	5 days	14/05/25 08:00	20/05/25 17:00	18
20		Dizajn suelja za prikazivanje narudžbi i ažuriranje stanja namirnica u kuhinji	5 days	21/05/25 08:00	27/05/25 17:00	19
21		Dizajn API-a	10 days	28/05/25 08:00	10/06/25 17:00	17
22		Definiranje ruta	5 days	28/05/25 08:00	03/06/25 17:00	
23		Dokumentacija metoda	5 days	04/06/25 08:00	10/06/25 17:00	22
24		Dizajn baze podataka	10 days	11/06/25 08:00	24/06/25 17:00	17;21
25		Odreivanje entiteta i njihovih relacija	2 days	11/06/25 08:00	12/06/25 17:00	
26		Odreivanje arhitekture baze	4 days	13/06/25 08:00	18/06/25 17:00	25
27		Dokumentiranje baze podataka	4 days	19/06/25 08:00	24/06/25 17:00	26
28		Implementacija sustava	93 days	25/06/25 08:00	31/10/25 17:00	14
29		Izrada baze podataka prema nacrtu	5 days	25/06/25 08:00	01/07/25 17:00	
30		Razvoj backenda i API metoda	30 days	02/07/25 08:00	12/08/25 17:00	29
31		Implementacija rezervacija i njihovog dohvaanja	10 days	02/07/25 08:00	15/07/25 17:00	
32		Izrada metoda za upravljanje narudžbama	15 days	02/07/25 08:00	22/07/25 17:00	
33		Implementacija metoda za ažuriranje stanja namirnica i njihovu narudžbu	15 days	23/07/25 08:00	12/08/25 17:00	31;32
34		Razvoj mobilne aplikacije za konobare	19 days	13/08/25 08:00	08/09/25 17:00	29;30

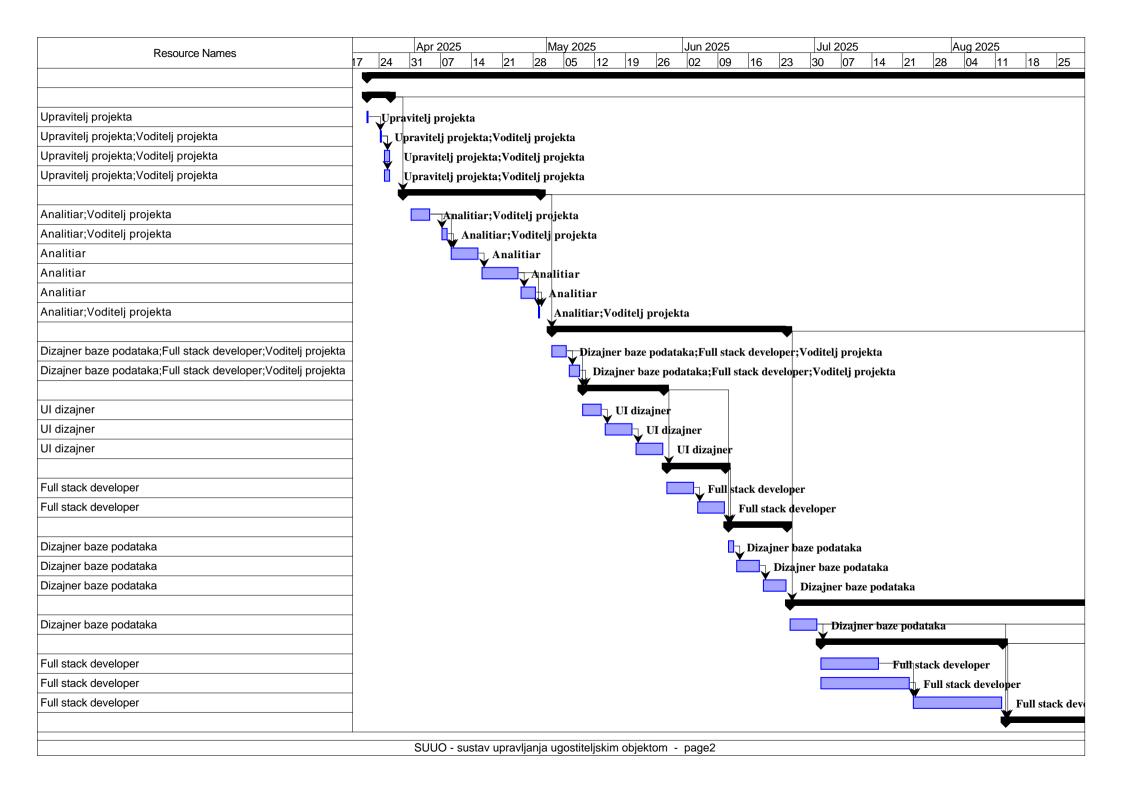

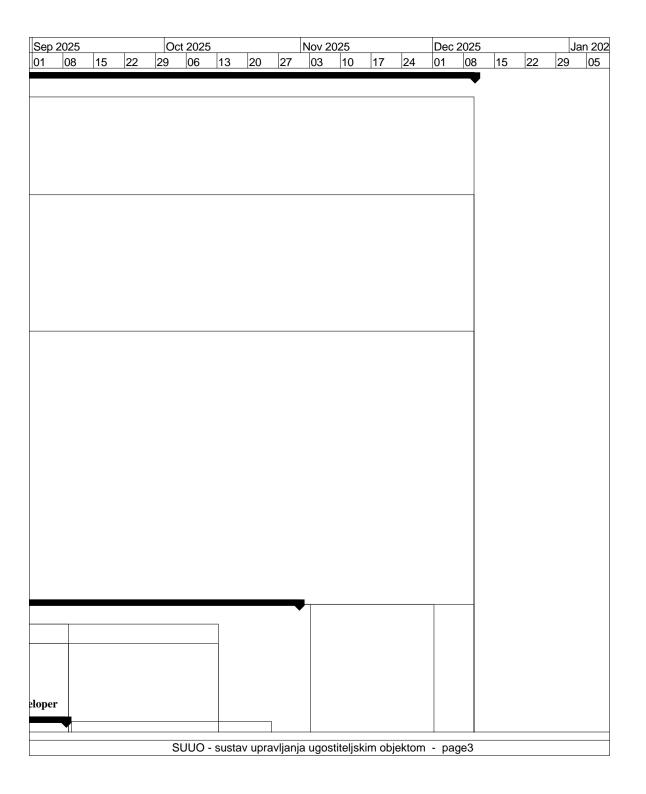

	(A)	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
35		Izrada suelja s prikazom slobodnih stolova	10 days	13/08/25 08:00	26/08/25 17:00	
36		Izrada prikaza nadolazeih rezervacija	10 days	13/08/25 08:00	26/08/25 17:00	
37	o	Implementacija suelja za unos narudžbi	10 days	26/08/25 08:00	08/09/25 17:00	
38		Razvoj aplikacije za kuhinjsko osoblje	25 days	09/09/25 08:00	13/10/25 17:00	29;30;34
39		Izrada suelja za prikazivanje aktivnih narudžbi i njihovo zatvaranje	15 days	09/09/25 08:00	29/09/25 17:00	
40	•	Implementacija suelja za ažuriranje stanja namirnica	10 days	30/09/25 08:00	13/10/25 17:00	
41	•	Izrada suelja za rezerviranje stolova te komunikaciju gosta s ugostiteljskim o	10 days	13/10/25 08:00	24/10/25 17:00	29;30
42	•	Sinkronizacija narudžbi sa ve postojeim sustavom za izdavanje rauna	5 days	25/10/25 08:00	31/10/25 17:00	34;38
43		Testiranje	20 days	03/11/25 08:00	28/11/25 17:00	28
44		Provoenje integracijskog testiranja	5 days	03/11/25 08:00	07/11/25 17:00	
45		Funkcijsko testiranje	5 days	10/11/25 08:00	14/11/25 17:00	44
46		Poboljšanja na temelju rezultata testiranja	10 days	17/11/25 08:00	28/11/25 17:00	44;45
47		Edukacija osoblja restorana	7 days	01/12/25 08:00	09/12/25 17:00	28;43
48		Edukacija konobara	7 days	01/12/25 08:00	09/12/25 17:00	
49		Edukacija kuhinjskog osoblja	7 days	01/12/25 08:00	09/12/25 17:00	
50		Završetak projekta	1 day	10/12/25 08:00	10/12/25 17:00	2;7;14;28;43;47

Resource Names			Apr 2025				May 2025					Jun 2025				Jul 2025				Aug 2025				
	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02		16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25
Full stack developer																								
Full stack developer																								
Full stack developer																								
Full stack developer																								
Full stack developer																								
Full stack developer																								
Full stack developer																								
QA tester																								
QA tester																								
Full stack developer																								
Full stack developer;Voditelj projekta																								
Full stack developer;Voditelj projekta																								
			SU	UO - s	sustav	uprav	ljanja ι	ugostit	eljskin	n objek	ktom -	- page	e5											

Sep 2	025			O	ct 2025	;			Nov 2	025			Dec	2025			J	an 202
01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05
ll stac	ck de	velope	r															
ll stac	ck de	velope	r															
	- II			eloper														
	*	un sta	ch uc	croper		_												
	_			т.	5-11 -4	, ,	1											
				r	full stac													
						V 1	full sta	ck dev	1-									
								y Full		develo	_							
									Full	stack	develo	per						
									—				4—					
										JQA	tester							
											QA	tester						
											Y		Full	stack	develo	per		
													¥			F		
															Full st	ماد ما		
																	_	
														$-\psi$	Full st	ack de	evelope	r;Vodi
								avljanja										
